

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Obsah

1. Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni programu	2
1.1 Hlavní aktivity realizované ve sledovaném období na úrovni programu	2
1.2 Naplňování indikátorů ROP JV	4
1.3 Hlavní problémy při realizaci programu	4
1.4 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV	5
2. Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni prioritních os a oblastí podpory	6
2.1 Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy	10
2.2 Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu	13
2.3 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel	16
2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc	19
3. Údaje o finančním vypořádání provádění pomoci	21
4. Administrativní zajištění programu	23
4.1 Realizace technické pomoci	23
4.2 Komunikační plán a jeho realizace	28
4.3 Realizace evaluačních činností	32
4.4 Aktivity Monitorovacího výboru	33
4.5 Zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP	33
5. Závěry a doporučení	35

Použité zkratky:

ČR – Česká republika

EU – Evropská unie

NF – Národní fond Ministerstva financí ČR

NOK – Národní orgán pro koordinaci

NUTS – územní statistická jednotka

ÚOHS – Ústav na ochranu hospodářské soutěže

ROP JV – Regionální operační program Jihovýchod

RR – Regionální rada

ŘO – řídicí orgán

VRR – Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

KoP – Komunikační plán ROP JV

1. Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni programu

Cílem Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále ROP JV) je posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod. Dle nastavení programu schváleného Evropskou komisí se tak stane prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojením rozvojových pólů regionu s rozvinutými, zkvalitňováním podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově. Tato opatření budou prováděna v souladu s principy udržitelného rozvoje a povedou především k lepšímu využívání potenciálu regionu v oblasti cestovního ruchu, k dalšímu rozvoji měst a ke stabilizaci osídlení venkovských oblastí.

1.1 Hlavní aktivity realizované ve sledovaném období na úrovni programu

Ve sledovaném období¹, tj. od podání minulé zprávy o realizaci v červnu 2008 do současnosti, byl zaznamenán pokrok směrem ke splnění zmíněných cílů uskutečněním zejména těchto opatření:

- vytváření a naplňování nezbytných podmínek pro realizaci ROP JV
 - Zkvalitňování systému administrace programu (např. prostřednictvím dalšího rozvoje informačních systémů nebo zkvalitňováním dokumentace – Výbor Regionální rady dne 5. 9. 2008 schválil Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod, verze 1.9, a Operační manuál Regionálního operačního programu Jihovýchod, verze 1.9)
 - Realizace a rozvoj komunikačních aktivit s žadateli a příjemci o dotaci z ROP JV (např. aktualizace příslušné dokumentace – Výbor Regionální rady dne 2. 7. 2008 schválil Komunikační plán Regionálního operačního programu Jihovýchod pro programovací období 2007–2013 a dne 5. 9. 2008 schválil Příručku pro žadatele a příjemce k Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod, verze 1.8)
 - Realizace finančních operací, nezbytných pro realizaci programu ROP JV (např. administrace žádostí o platbu, příprava souhrnné žádosti o platbu)
 - Zvyšování absorpční kapacity regionu (např. pořádání odborných seminářů pro žadatele a příjemce)
- spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty, koordinace a komplementarita operačních programů

¹ Sledovaným obdobím v tomto dokumentu rozumíme konkrétně časové rozmezí od 1. 6. 2008 do 1. 11. 2008. Výjimku tvoří kapitoly 4.2 Realizace technické pomoci a 4.3 Komunikační plán a jeho realizace, ve kterých je sledovaným obdobím časové rozmezí od 1. 1. 2008 do 1. 11. 2008.



- Zastoupení ROP JV v Monitorovacím výboru Operačního programu Podnikání a inovace a v Monitorovacím výboru Výzkum a vývoj pro inovace, recipročně zastoupení členů i ostatních operačních programů v ROP JV
- Koordinace na úrovni Řídicího a koordinačního výboru, schůzky ředitelů operačních programů za účelem koordinace implementace
- Řídicí orgán ROP JV umožňuje účast zaměstnanců na školeních a seminářích týkajících se Evropského sociálního fondu programů a naopak, vzájemná výměna informací zejména v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, možnost křížového financování
- Dle poslední čtvrtletní Zprávy o plnění úkolů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti nebyly zjištěny nevhodné překryvy ROP JV a ostatních operačních programů
- Dohody o vzájemné spolupráci Řídicího orgánu ROP JV a řídicích orgánů Integrovaný operační program a Operační program Doprava
- ŘO spolupracoval s NOK na úpravách Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
- ŘO spolupracuje s NOK a Národním fondem na rozvoji monitorovacího systému
- Probíhá spolupráce s ÚOHS při posuzování veřejné podpory
- Spolufinancování programu z národních veřejných zdrojů je zabezpečeno tím, že jsou uzavřeny smlouvy s kraji regionu NUTS 2 Jihovýchod (Jihomoravským krajem a Vysočinou) na celé programové období 2007–2013 a nastaveny postupy pro administraci žádosti o dotaci a její poskytnutí Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (formou Rámcového rozhodnutí o poskytování dotací ROP JV v období 2007–2013).
- realizace výzev k předkládání projektů v oblastech podpory:
 - Dne 3. 7. 2008 byla vyhlášena nová kontinuální výzva v oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu – silnice. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod tuto výzvu schválil na svém 11. zasedání dne 29. 4. 2008.
 - Proběhly kolové výzvy pro oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (obě vyhlášeny dne 1. 8. 2008 a ukončeny 17. 10. 2008) a také kolová výzva pro oblast podpory 1.4 Rozvoj dopravy pro bezmotorovou dopravu (vyhlášena dne 1. 9. 2008 a ukončena 31. 10. 2008). Všechny tři výzvy schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 13. zasedání dne 2. 7. 2008.
 - Dne 7. 7. 2008 byly ukončeny výzvy v oblastech podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel



hromadné přepravy osob, 1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu, 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2 Služby pro cestovní ruch (vyhlášeny dne 5. 5. 2008).

- Pokračují kontinuální výzvy pro letiště (oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu), pro oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center a pro oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu, vyhlášené dne 5. 5.2008.
- Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (VRR) dne 2. 7. 2008 schválil Integrovaný plán rozvoje města Jihlavy „Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti.“ Dne 7. 10. 2008 VRR schválil Integrovaný plán rozvoje města Brna „Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“.

1.2 Naplňování indikátorů ROP JV

Cílem monitorování a hodnocení ROP podporovaného ze zdrojů EU je měření účinnosti poskytované podpory, hodnocení dopadů na cíle stanovené pro řešení specifických strukturálních problémů. Hlavním předpokladem pro posouzení účinnosti podpory je použití systému monitorovacích indikátorů, resp. získávání kvalitních dat a informací o implementaci programu. V první fázi jsou potřebné údaje o projektech získávány ze žádosti o poskytnutí pomoci. Následný sběr informací a údajů o projektech je navržen jako integrovaný systém tvořený několika úrovněmi monitorovacích zpráv, které jsou zpracovávány příjemci podpory. Tyto údaje slouží jako podklad pro sledování věcného pokroku a pro přípravu monitorovacích zpráv na úrovni programu.

V současné době má řídicí orgán zatím k dispozici jen dílčí data o stavu naplňování hodnot indikátorů. To je dáno harmonogramem sběru dat – monitorovací zprávu / hlášení předkládá příjemce podpory s půlroční periodicitou od data podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Odevzdaná data tak zatím nejsou relevantní pro vyhodnocování programu jako celku.

1.3 Hlavní problémy při realizaci programu

V říjnu/listopadu 2008 byla zpracována další analýza rizik implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV). Dle jejích výsledků mezi potenciálně nejvýznamnější rizika patří:

- nedostatečný informační systém (IS),
- velký počet na sobě závislých informačních systémů a neintegrita systému,
- nedostatečná personální kapacita ŘO,
- změny podmínek v průběhu implementace a nedostatečná kontrola změn v IS.



Největší pokles významnosti rizika byl zaznamenán u rizika nedostatečné informovanosti, rizika nedodržení pravidla N+3/N+2 a nevyčerpání přidělených financí. Oproti tomu největší nárůst významnosti rizika byl zaznamenán u rizika změny podmínek v průběhu implementace.

1.4 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod na jednání 2. 6. 2008 v Jihlavě doporučil Regionální radě vzít v úvahu námitky prezentované koordinačním uskupením neziskových organizací kraje Vysočina ve věci projednávání IPRM města Jihlavy „Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“. Výbor regionální rady tyto připomínky projednal dne 7. 10. 2008. Připomínky byly vypořádány a IPRM mohlo být schváleno.

2. Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni prioritních os a oblastí podpory

Regionální operační program Jihovýchod je realizován v rámci čtyř prioritních os:

1 Dostupnost dopravy, 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel a 4 Technická pomoc. Pro každou osu jsou určeny konkrétní oblasti podpory, v jejichž rámci může určený příjemce žádat o podporu z ROP JV.

Úspěšný projekt musí splnit formální kritéria, kritéria přijatelnosti, získat dostatečný počet bodů při hodnocení a také uspět v konkurenci ostatních projektů. Při hodnocení projektů žádajících o podporu z ROP JV je zohledněn nejen jejich přínos pro naplňování cílů jednotlivých prioritních os a oblastí podpory, ale také v oblasti horizontálních témat. Těmi jsou rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Projekty s negativním vlivem na horizontální témata jsou z podpory ROP JV vyloučeny.

V období od 1. 6. 2008 do 1. 11. 2008 bylo v ROP JV zaregistrováno 457 projektů.


Ke dni 1. 11. 2008 bylo od počátku programového období v rámci ROP JV zaregistrováno 865 projektů, z toho 305 bylo zamítnuto a u 83 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. U ostatních projektů zatím nebyl dokončen hodnotící proces.

Tabulka č. 1: Počty projektů schválených VRR v jednotlivých prioritních osách (stav k 1. 11. 2008)

Prioritní osa	Projekty schválené VRR	Projekty s podepsanou smlouvou
1	52	15
2	117	35
3	87	28
4	6	5
Celkem	262	83

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+

Graf č. 1: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu a prioritní osy (stav k 1. 11. 2008)

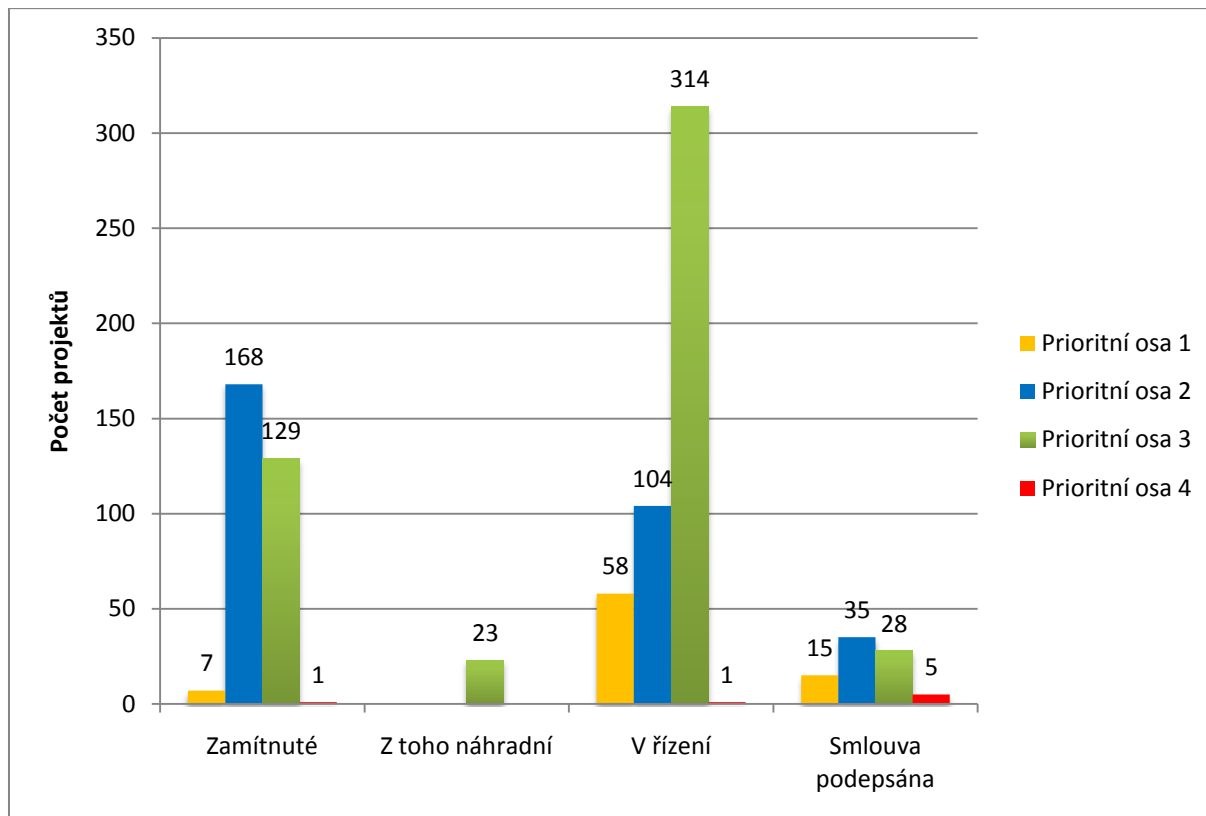

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+

²Tabulka č. 2: Počty projektů v jednotlivých prioritních osách podle typu příjemce a stavu (stav k 1. 11. 2008)

Typ příjemce	Zaregistrované	Zamítnuté	z toho náhradní	V řízení	Smlouva podepsána
kraj ³	80	4	0	56	20
obec ⁴	524	171	21	321	32
sdružení obcí	45	24	0	15	6
veřejné NNO	37	15	2	20	2
neveřejné NNO	27	14	0	10	3
MSP	146	77	0	54	15
RR	6	0	0	1	5
Celkem	865	305	23	477	83

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+


² Údaje v tabulkách jsou platné k 1. 11. 2008.

³ Tzn. projekty krajů, jimi zakládaných a zřizovaných organizací a projekty právnických osob s účastí kraje.

⁴ Tzn. projekty obcí, jimi zakládaných a zřizovaných organizací a projekty právnických osob s účastí obce.

V programovém období bylo dosud nasmlouváno přibližně 1 681 mil. Kč, což představuje přibližně 8,5% celkové alokace programu. Registrováno bylo 16 žádostí o platbu v celkové výši požadované podpory 204 903 993 Kč. Z toho 9 žádostí podala Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc, a to ve výši přibližně 63,4 mil. Kč. Ostatní žádosti o platbu podaly kraje – šlo o 4 žádosti o platbu v prioritní ose 1 Dostupnost dopravy s celkovou požadovanou částkou ve výši přibližně 139,5 mil. Kč a 3 žádosti o platbu v prioritní ose 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu s celkovou požadovanou částkou ve výši přibližně 4,2 mil. Kč.

Graf č. 2: Požadovaná a schválená výše dotace pro projekty registrované v ROP JV – podle stavů a prioritních os (stav k 1. 11. 2008)

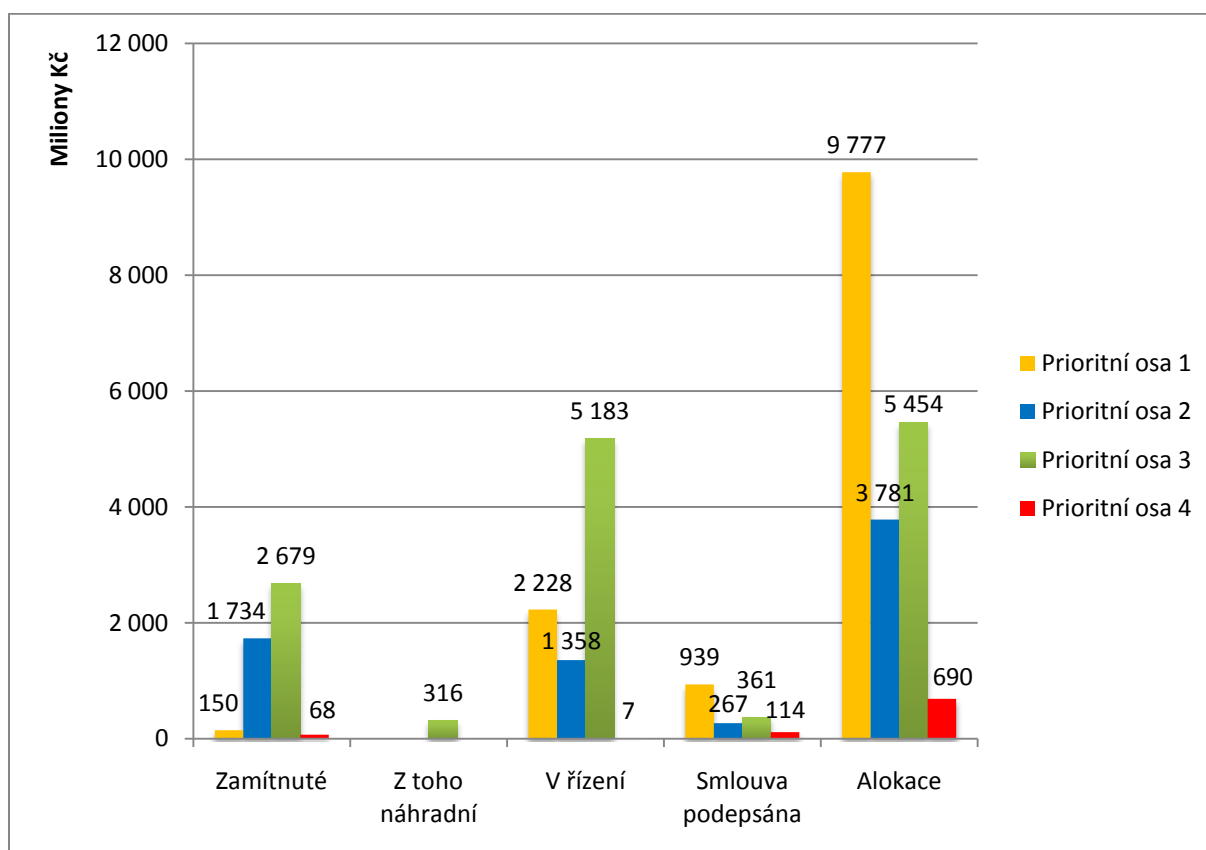

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+



Tabulka č. 3: Částka dotace podle typu příjemce a stavů projektů (v Kč)

Typ příjemce	Zaregistrované	Zamítnuté	z toho náhradní	V řízení	Smlouva podepsána
kraj ⁵	2 775 602 529	87 194 051	0	1 667 863 375	1 020 545 102
obec ⁶	8 929 948 585	3 034 627 413	296 691 813	5 555 505 410	339 815 762
sdružení obcí	386 987 187	137 903 954	0	229 196 644	17 886 589
veřejné NNO	306 932 188	84 901 417	18 851 925	205 504 011	16 526 760
neveřejné NNO	321 121 820	184 241 146	0	126 274 547	10 606 128
MSP	2 248 426 546	1 101 512 273	0	984 890 067	162 024 206
RR	120 618 125	0	0	6 783 000	113 835 125
Celkem	15 089 636 980	4 630 380 253	315 543 738	8 776 017 054	1 681 239 673

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+

⁵ Tzn. projekty krajů, jimi zakládaných a zřizovaných organizací a projekty právnických osob s účastí kraje.

⁶ Tzn. projekty obcí, jimi zakládaných a zřizovaných organizací a projekty právnických osob s účastí obce.

2.1 Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy

Hlavním cílem prioritní osy 1 Dostupnost dopravy je zkvalitnění dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti území regionu soudržnosti Jihovýchod, a to v souladu s udržitelným rozvojem. Specifickými cíli jsou napojení regionu soudržnosti na nadregionální dopravní síť TEN-T, zlepšení úrovně veřejné dopravy s důrazem na podporu environmentálně šetrných druhů veřejné dopravy, vybudování husté sítě vhodně umístěných bezpečných cyklostezek a zvýšení bezpečnosti chodců v urbanizovaných prostorech.

Tyto cíle jsou naplňovány v rámci čtyř oblastí podpory:

- 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
- 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
- 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob
- 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

Podpora je zaměřena například na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy, dopravních terminálů, na nákup ekologických veřejných dopravních prostředků, vozidel terminály, vozidel pro příměstskou regionální dopravu, na výstavbu cyklostezek nebo na stavebnětechnická opatření pro nevidomé.

Možnými příjemci podpory pro tuto prioritní osu jsou kraje a organizace zřizované krajem.

Ve sledovaném období (od 1. června 2008 do 1. listopadu 2008) byly v prioritní ose 1 vyhlášeny následující výzvy:

- Dne 3. 7. 2008 byla vyhlášena nová kontinuální výzva v oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu – silnice.
- kolová výzva pro oblast podpory 1.4 Rozvoj dopravy pro bezmotorovou dopravu (vyhlášena dne 1. 9. 2008 a ukončena 31. 10. 2008).
- Dne 7. 7. 2008 byly ukončeny výzvy v oblastech podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob, 1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu (vyhlášeny dne 5. 5. 2008).
- Pokračují kontinuální výzvy pro letiště (oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu), pro oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center a pro oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu, vyhlášené dne 5. 5. 2008.

V období od 1. 6. 2008 do 1. 11. 2008 bylo v prioritní ose 1 zaregistrováno 43 projektů.

Ke dni 1. 11. 2008 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 1 zaregistrováno 80 projektů, z toho 7 bylo zamítnuto a u 15 byla podepsána Smlouva o


poskytnutí dotace. U ostatních projektů nebyl dokončen hodnoticí proces. Z alokace pro prioritní osu 1 bylo zatím nasmlouváno přibližně 939 mil. Kč, což představuje přibližně 9,60 %. V rámci prioritní osy 1 byly dosud podány 4 žádosti o platbu. Jejich celková požadovaná výše podpory činí 139 500 284 Kč.

Příklady projektů schválených VRR k financování ve sledovaném období: výstavba okružní křižovatky na silnici II/602 v obci Veselka, rekonstrukce průtahu v obci Křenovice - silnice II/416 a II/417, Silnice II/377 Rájec – Bořitov, rekonstrukce silnice II/416 v o obci Pohořelice, rekonstrukce silnice II/374 mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou.

Specifické problémy realizace osy 1 Dostupnost programu


Evropská Komise posuzuje notifikaci podpory nákupu ekologických autobusů a nákupu a modernizace železničních kolejových vozidel.

Graf č. 3: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu – prioritní osa 1 (stav k 1. 11. 2008)

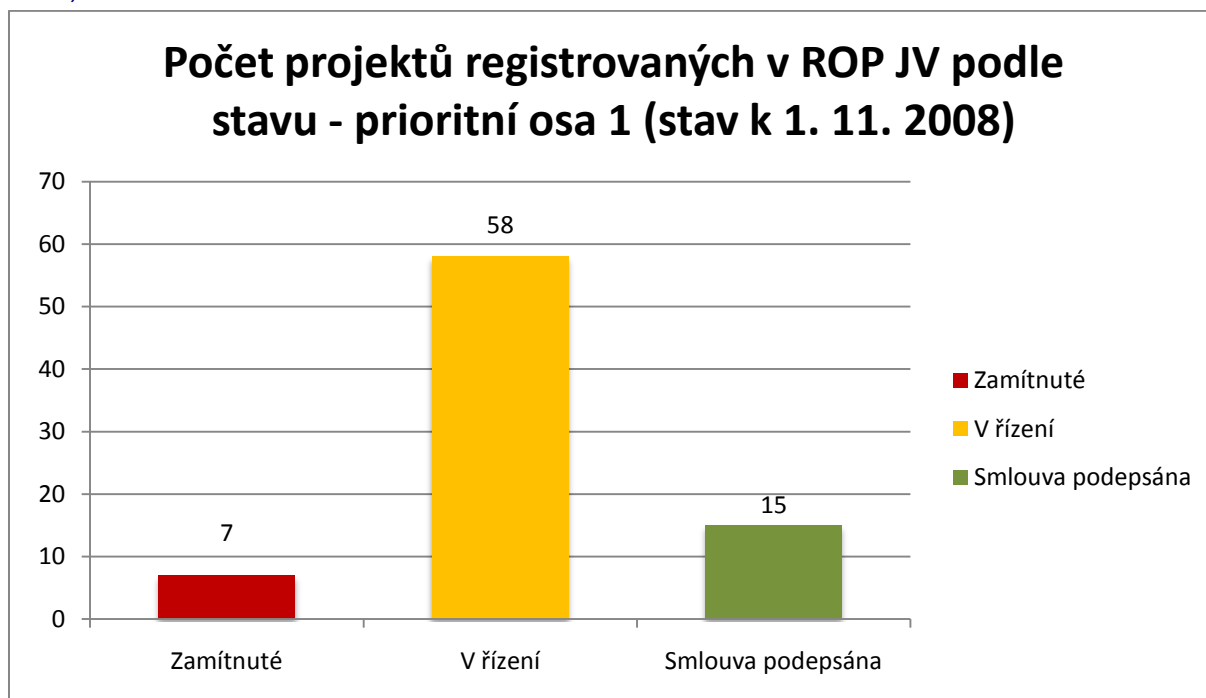

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+

Graf č. 4: Nasmlouvaná výše dotace pro prioritní osu 1 podle krajů (%)

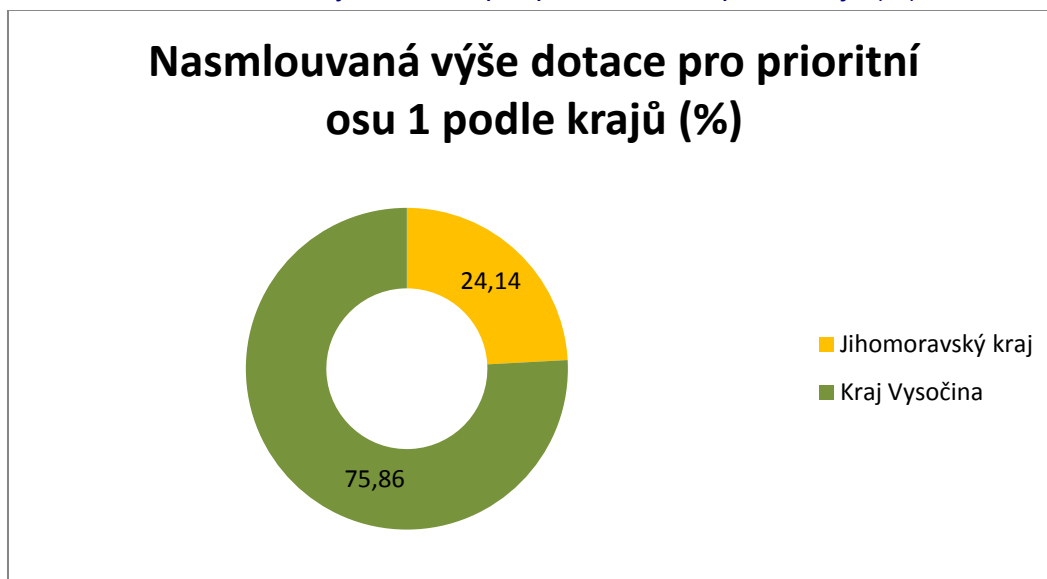

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+

Příklad realizace projektu:

Přestupní uzel Bučovice, železniční stanice



Realizace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 14, 6 mil. Kč.; 25. 3. – 20. 6. 2008,
4 autobusové zastávky, parkoviště, přístřešky pro cestující i odstavená kola.

2.2 Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Cílem prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu je zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu podporou rozvoje infrastruktury a technického zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů.

Tento cíl je naplňován ve dvou oblastech podpory:

- 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch,
- 2.1 Rozvoj služeb v cestovním ruchu.

Podpora může být například zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení lázeňských a kongresových center, rekreační zařízení, turistická informační centra, zpřístupnění památek, podporovány jsou rovněž např. výstavba ubytovacích a stravovacích kapacit, značení cyklotras, výstavba hipostezek a další aktivity.

Možnými příjemci podpory jsou například obce, svazky obcí a jejich organizace, kraje, nebo právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé.

Dne 7. 7. 2008 byly ukončeny výzvy v oblastech podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2 Služby pro cestovní ruch (vyhlášeny dne 5. 5. 2008).

V období od 1. 6. 2008 do 1. 11. 2008 bylo v prioritní ose 2 zaregistrováno 153 projektů.


Ke dni 1. 11. 2008 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 2 zaregistrováno 307 projektů, z toho 168 bylo zamítnuto a u 35 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. U ostatních projektů nebyl dokončen hodnoticí proces. V prioritní ose 2 bylo zatím nasmlouváno přibližně 267,3 mil. Kč, což představuje 7,07% její alokace. V jejím rámci byly dosud podány 3 žádosti o platbu o celkové výši 4 172 595 Kč.

Příklady projektů schválených VRR k financování ve sledovaném období: Zpřístupnění brněnského podzemí, Stavba vyhlídkové věže u zříceniny hradu Louka, Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina, Tvorba koncepčních a strategických dokumentů pro oblast cestovního ruchu, Turistické zpřístupnění židovských památek v Brně.

Specifické problémy realizace osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu


V rámci prioritní osy 2 je patrný velký zájem žadatelů o dotaci z ROP JV. Většina projektů byla pro nedostatečnou kvalitu nebo nesoulad s cíli programu zamítnuta. Tuto situaci Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod řeší opatřeními v rámci Komunikačního plánu (např. semináře zaměřené na příjemce a žadatele).

Graf č. 5: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu – prioritní osa 2 (stav k 1. 11. 2008)

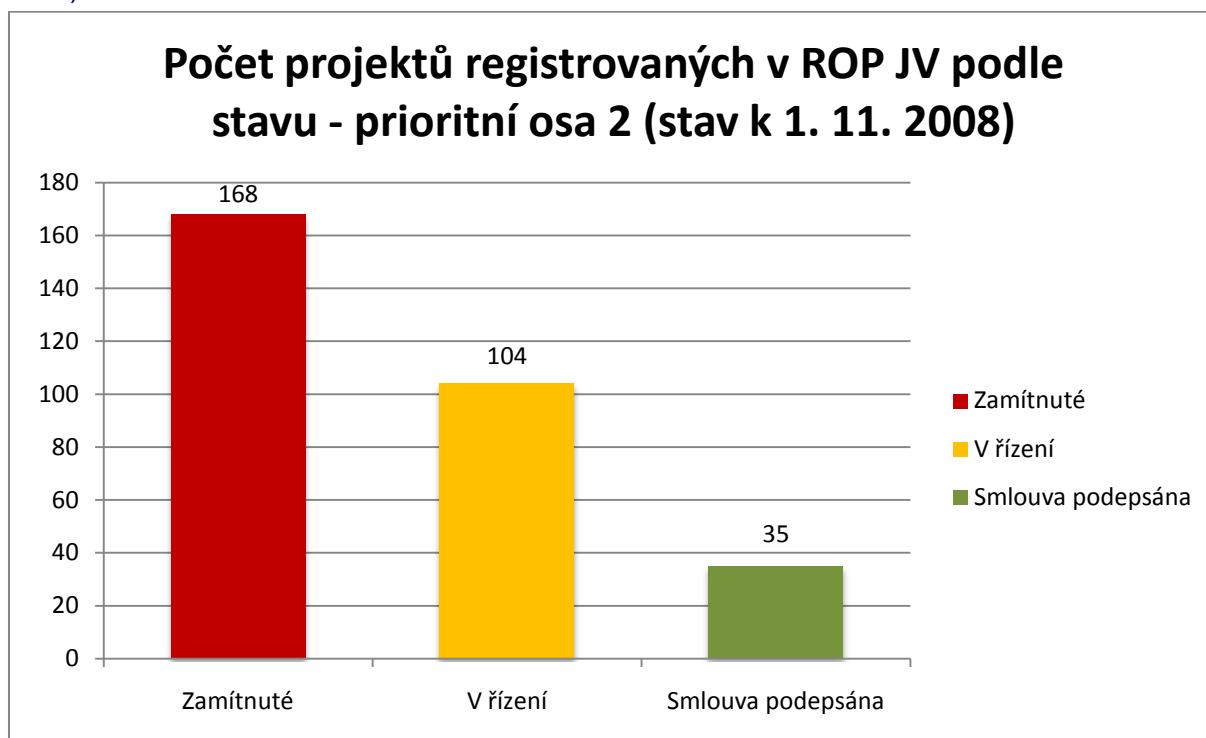


Zdroj dat: Monitorovací systém Monit7+

Graf č. 6: Nasmlouvaná výše dotace pro prioritní osu 2 podle krajů (%)

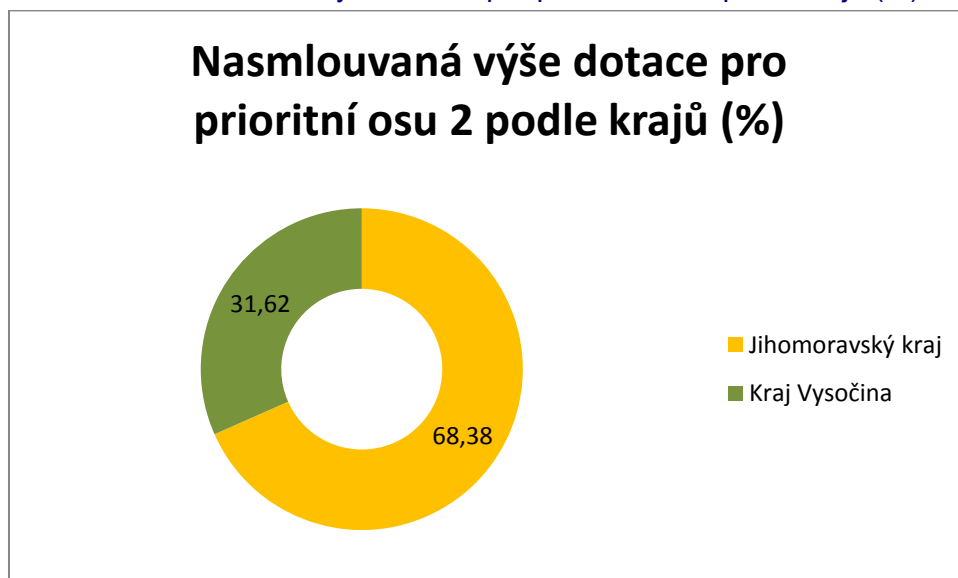

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit7+

Příklad realizace projektu:
Alexandrova rozhledna

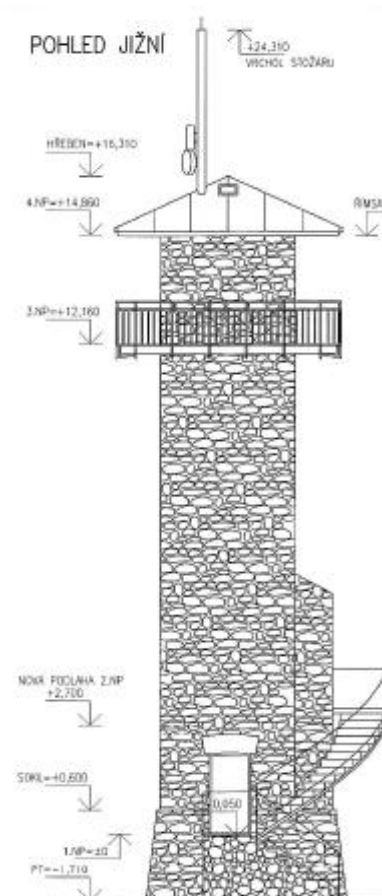

Realizace: Město Adamov/Lipovec u Adamova, 2,77 mil. Kč, 7. 10. – 27. 10. 2008, turistický bod a dominanta kraje od 19. století.

2.3 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Hlavním cílem prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru. Specifickými cíli jsou rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako akceleratorů růstu a rozvoje regionu, posilování úlohy regionálních středisek jako dalších významných rozvojových center regionu, udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život a celkové zvyšování kvality života obyvatel regionu.

Tyto cíle jsou naplňovány ve čtyřech oblastech podpory:

- 3.1 Rozvoj urbanizačních center,
- 3.2 Rozvoj regionálních středisek,
- 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel,
- 3.4 Veřejné služby regionálního významu.

Podpora je zaměřena například na obnovu zchátralých a nevyužívaných objektů a ploch v obcích, úpravy náměstí, dětských hřišť a zeleně, výstavba a technické zhodnocení škol, zdravotnických, neziskových sociálních zařízení, kulturních zařízení a zařízení pro činnost spolků a občanských iniciativ a výstavba místních datových sítí pro veřejnost (podpora nabídky).

Možnými příjemci podpory jsou například definované obce a jejich organizace, svazky obcí, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, příp. kraje.

V rámci prioritní osy 3 proběhly kolové výzvy pro oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (obě vyhlášeny dne 1. 8. 2008 a ukončeny 17. 10. 2008) a nadále pokračují kontinuální výzvy v oblastech podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center a 3.4 Veřejné služby regionálního významu, vyhlášené dne 5. 5.2008.

VRR dne 2. 7. 2008 schválil Integrovaný plán rozvoje města Jihlavy „Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti.“ Dne 7. 10. 2008 VRR schválil Integrovaný plán rozvoje města Brna „Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“.

V období od 1. 6. 2008 do 1. 11. 2008 bylo v prioritní ose 3 zaregistrováno 260 projektů. Ke dni 1. 11. 2008 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 3 zaregistrováno 471 projektů, z toho 129 bylo zamítnuto a u 28 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. U ostatních projektů nebyl dokončen hodnotící proces. V prioritní ose 3 bylo zatím


nasmloouváno přibližně 361 149 214 Kč, což představuje přibližně 6,62% celkové alokace pro prioritní osu. Dosud nebyly podány žádné žádosti o platbu.

Příklady projektů schválených VRR k financování ve sledovaném období: vybudování parku Gustava Mahlera v centru Jihlavy, zbudování nového oddělení Nemocnice v Třebíči – Pavilon pro matku a dítě, revitalizace části parku Malý Heulos v centru Jihlavy.

Specifické problémy realizace prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel


V procesu přípravy a schvalování IPRM města Brno („Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti“) proběhly další konzultace a vypořádání připomínek Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. Byla ustavena dohodovací komise pro přijetí usnesení ve věci schválení tohoto IPRM.

Graf č. 7: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu – prioritní osa 3 (stav k 1. 11. 2008)

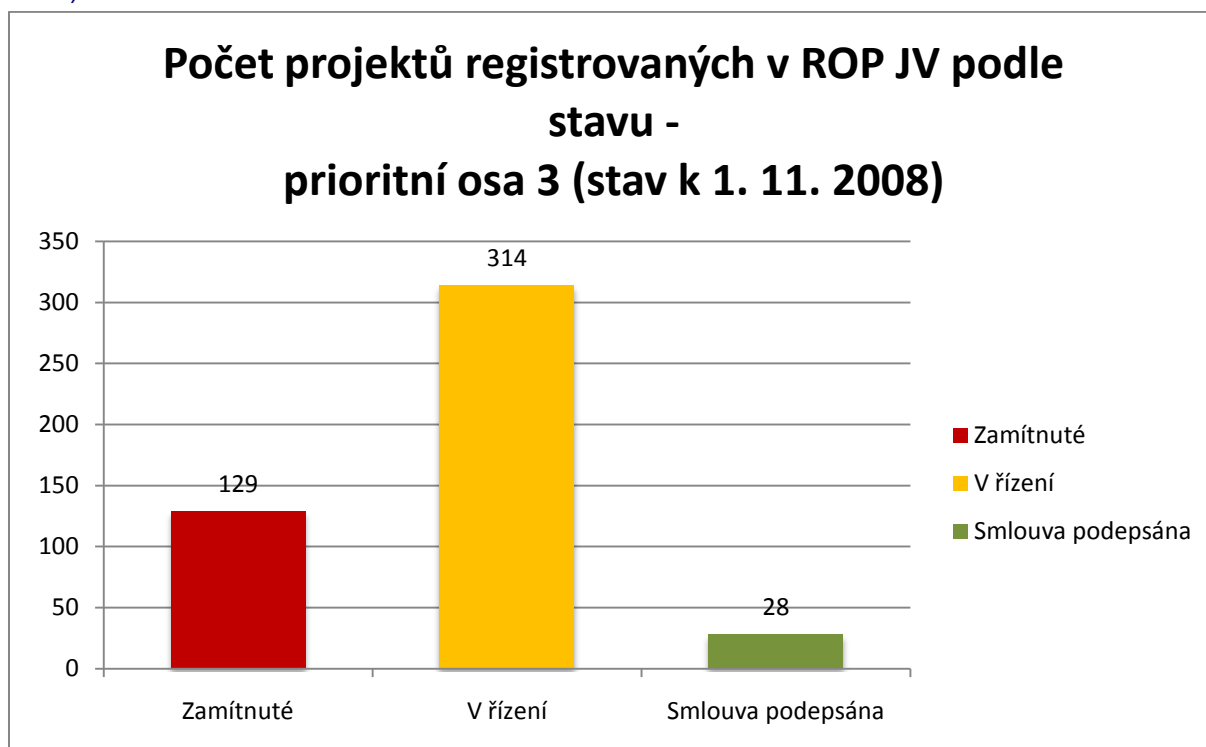

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+

Graf č. 8: Nasmlouvaná výše dotace pro prioritní osu 3 podle krajů (%)

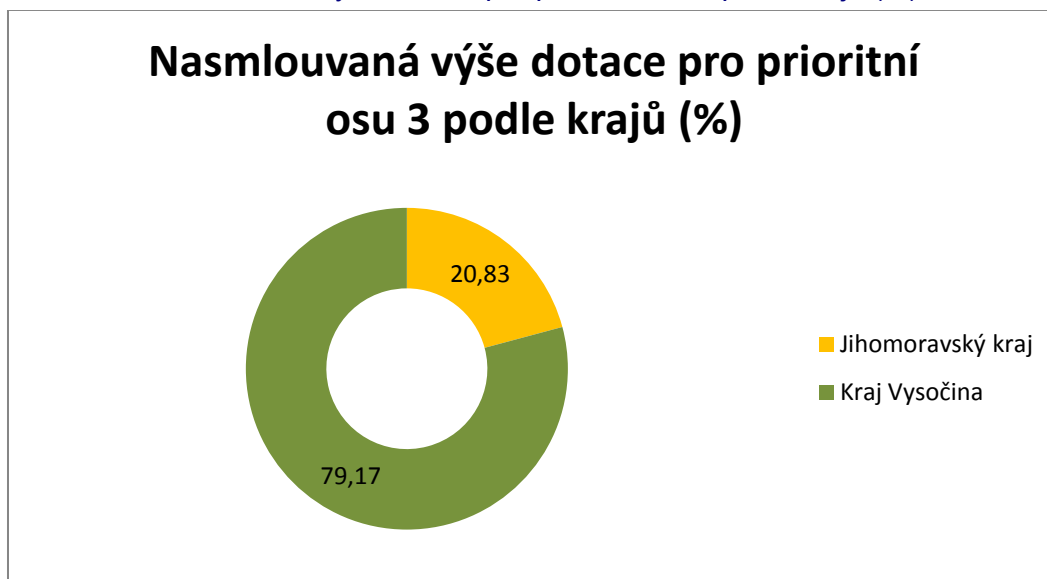

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+

Příklad realizace projektu:

Hlavní lůžková budova nemocnice



Realizace: Kraj Vysočina/Pelhřimov, 151, 99 mil. Kč, 1. 6. 2008 – 31. 5. 2011, Přístavba a nástavba hlavní lůžkové budovy nemocnice, vybavení novou moderní lékařskou technologií.

2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc

Hlavním cílem prioritní osy 4 Technická pomoc je zajišťovat aktivity podporující efektivní řízení, kontrolu, sledování a vyhodnocování realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod, aktivity spojené s propagací a poskytováním informací o programu a posilováním absorpční kapacity regionu.

Tento cíl je naplňován ve dvou oblastech podpory:

- 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP
- 4.2 Podpora absorpční kapacity

Možnými příjemci podpory jsou Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod a kraje.

V období od 1. 6. 2008 do 1. 11. 2008 byl v prioritní ose 4 zaregistrován 1 projekt.


Ke dni 1. 11. 2008 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 1 zaregistrováno 7 projektů, z toho 1 byl zamítnut, 1 je v řízení a k 5 projektům bylo vydáno usnesení VRR o poskytnutí dotace. V prioritní ose 4 bylo zatím nasmlouváno

113 835 125 Kč, což představuje přibližně 16,50 % celkové alokace pro prioritní osu. V jejím rámci bylo dosud podáno 9 žádostí o platbu o celkové výši 63 417 588 Kč.

Specifické problémy realizace prioritní osy 4 Technická pomoc

V rámci čtvrté prioritní osy byla zjištěna potřeba realokace zdrojů mezi jednotlivými oblastmi podpory. V této souvislosti je plánováno vyhlášení nové kontinuální výzvy pro prioritní osu Technická pomoc. Výbor Regionální rady novou výzvu schválil s předpokládaným termínem vyhlášení dne 5. 12. 2008 za podmínky, že Monitorovací výbor ROP JV na svém 5. zasedání schválí přesun finančních prostředků v této prioritní ose.

Graf č. 9: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu – prioritní osa 4 (stav k 1. 11. 2008)

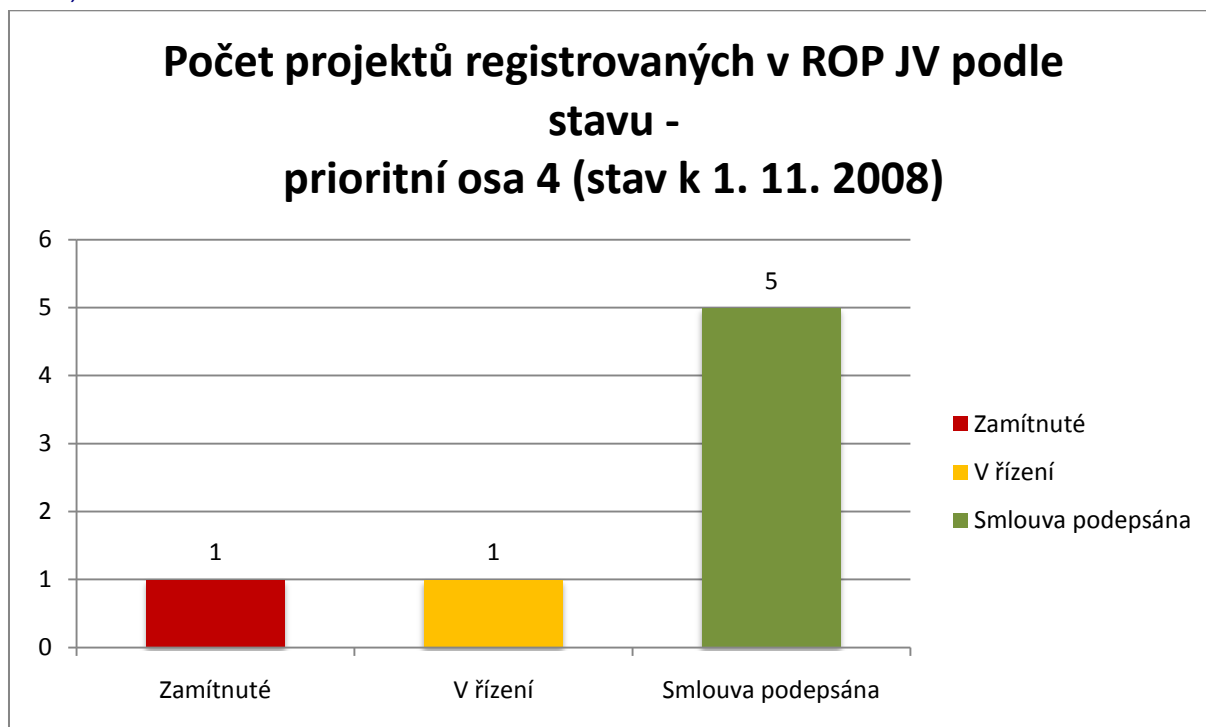

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+

3. Údaje o finančním vypořádání provádění pomoci

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod zdárně prošla v roce 2007 kontrolou hospodaření za rok 2006 a částečně za rok 2007, prováděnou Ministerstvem financí ČR podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, ve znění pozdějších předpisů, což svědčí o správnosti nastavení a dodržování právních norem a postupů v hospodaření Regionální rady Jihovýchod jako řídicího orgánu ROP JV.

Podle pravidla N+3/N+2 musí být každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi splněn do tří (resp. dvou) let od přijetí tohoto závazku (do konce třetího roku po roce přijetí závazku). Pravidlo N+3 platí v ČR pro období 2007–2010 včetně. Pravidlo N+2 potom pro období 2011–2013. Při nerespektování těchto pravidel může Evropská komise část závazku, který nebyl uhrazen platbou na účet, nebo na kterou neobdržela žádost o platbu, zrušit.

Vývoj kurzu české koruny na devizových trzích směřoval k celkovému posilování české národní měny. S využitím vlastních zkušeností a příkladů dobré praxe zahraničních expertů v rámci interního vzdělávacího kurzu „Přenos know-how a dobré praxe řízení regionálního operačního programu“ (Learning by doing) pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod jsou přijímána opatření, která mají výrazně snížit riziko nedočerpání nebo přečerpání alokace operačního programu. V současné době jde především o plánování výzev a jejich alokací.

V rámci provádění ROP Jihovýchod byla v listopadu vytvořena první souhrnná žádost o platbu. Dosud nebyly certifikovány žádné výdaje.

Tabulka č. 4: Celkové alokace prioritních os a programu a podíl nasmlouvané alokace⁷


Prioritní osa	Smlouva podepsána	Alokace	Podíl nasmlouvané dotace z alokace (%)
1	938 961 940	9 777 200 445	9,60
2	267 293 395	3 781 004 863	7,07
3	361 149 214	5 454 397 246	6,62
4	113 835 125	689 793 132	16,50
Celkem	1 681 239 673	19 702 395 686	8,53

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+

⁷ Alokačí se rozumí součet podílu ERDF a podílu národních veřejných zdrojů na financování programu.



Graf č. 10: Podíl nasmlouvané dotace podle krajů a TP (%)

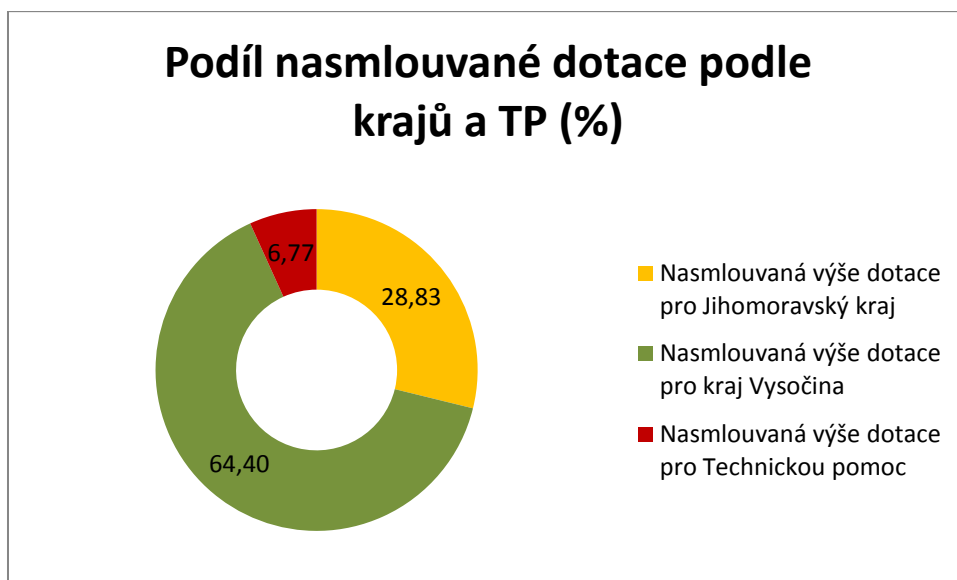

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+

4. Administrativní zajištění programu

4.1 Realizace technické pomoci

Technická pomoc je realizována v rámci čtvrté prioritní osy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod⁸.

Při koordinaci činností jako je plánování, schvalování projektových záměrů, kontrola plnění rozpočtu v rámci jednotlivých projektů a navrhování opatření k řádnému fungování technické pomoci, sehrává důležitou úlohu Komise pro technickou pomoc. V Komisi jsou zastoupeni členové vedení Úřadu Regionální rady. V roce 2008 se Komise setkala šestkrát. Hlavními tématy byla příprava plánu technické pomoci pro rok 2009 a čerpání rozpočtu aktivních projektů.

V roce 2008 předložila Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 3 projektové žádosti.

Tabulka č. 5: Projekty prioritní osy 4 – Technická pomoc v roce 2008 (celkové způsobilé výdaje a dotace v Kč)

Registrační číslo projektu	Název projektu	Název žadatele	Celkové způsobilé výdaje	Dotace
CZ.1.11/4.1.00/01.00007	Řízení a implementace ROP JV 2008	RR JV	61 945 000	57 299 125
CZ.1.11/4.1.00/01.00008	Monitoring a evaluace 2008	RR JV	5 220 000	4 828 500
CZ.1.11/4.2.00/01.00009	Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008	RR JV	16 900 000	15 632 500
CZ.1.11/4.2.00/01.00405	Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod	RR JV	6 783 000	6 274 275
Prioritní osa 4 celkem			90 848 000	84 034 400

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit7+

Tabulka č. 6: Projekty technické pomoci a žádosti o proplacení v roce 2008

Registrační číslo projektu	Název projektu	Název žadatele	Proplaceno – podíl ERDF	Proplaceno – podíl SR
CZ.1.11/4.1.00/01.00007	Řízení a implementace ROP JV 2008	RR JV	43 235 296	3 814 879
CZ.1.11/4.1.00/01.00008	Monitoring a evaluace 2008	RR JV	887 400	78 300

⁸ Viz kapitolu 2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc.



Registrační číslo projektu	Název projektu	Název žadatele	Proplaceno – podíl ERDF	Proplaceno – podíl SR
CZ.1.11/4.2.00/01.00009	Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008	RR JV	10 879 495	959 955
CZ.1.11/4.2.00/01.00405	Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod	RR JV	0	0

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit7+

Stav naplňování indikátorů souhrnně za projekty za rok 2008 k datu 5. 8. 2008 (datum odevzdání poslední monitorovací zprávy v rámci 4. prioritní osy) jsou uvedeny v tabulce č. 6 a 7.

Tabulka č. 7: Plnění indikátorů výstupu prioritní osy 4 – Technická pomoc

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	Cílová hodnota 2015	Dosažená hodnota
710500 Výstup	Realizace evaluačních studií a zpráv	Počet	ŘO	Dosažená		1
				Plánovaná	14	
				Výchozí		
710700 Výstup	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet druhů materiálů	ŘO	Dosažená		10
				Plánovaná	65	
				Výchozí		
711101 Výstup	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí	Počet akcí	ŘO	Dosažená		22
				Plánovaná	100	
				Výchozí		
711102 Výstup	Z toho akcí uskutečněných za mezinárodní účasti	Počet akcí	ŘO	Dosažená		2
				Plánovaná	20	
				Výchozí		

Zdroj dat: Monitorovací zprávy projektů k 5. 8. 2008



Tabulka č. 8: Plnění indikátorů výsledku prioritní osy 4 – Technická pomoc

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	Cílová hodnota 2015	Dosažená hodnota
711500 Výsledek	Počet účastí na zahraničních akcích zaměřených na prohlubování znalostí a výměnu informací	Počet osob, které se zúčastnily zahraničních konzultací	ŘO	Dosažená		4
				Plánovaná	14	
				Výchozí		
712501 Výsledek	Počet uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků	Počet uskutečněných kontrol (ex-ante, mid-term, ex post, kontrola vzorků)	ŘO	Dosažená		126
				Plánovaná	466	
				Výchozí		
711601 Výsledek	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů na posílení absorpční kapacity	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci	ŘO	Dosažená		1079
				Plánovaná	1250	
				Výchozí		
711900 Výsledek	Počet proškolených osob	Počet osob	ŘO	Dosažená		
				Plánovaná	88	
				Výchozí		

Zdroj dat: Monitorovací zprávy projektů k 5. 8. 2008

Oblast podpory 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP

Hlavním cílem této oblasti podpory je zajištění odpovědné a účinné správy a implementace ROP JV a zajištění účinné technické pomoci pro všechny relevantní aktéry procesu správy a implementace ROP JV.

V rámci oblasti 4.1 je financována např. příprava a organizace jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Monitorovacího výboru ROP JV a jiných pracovních skupin včetně účasti odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních. Dále příprava, výběr, ocenění a sledování pomoci a operací; kontroly prováděné na místě činností, kontroly zadávání veřejných zakázek, dohled nad pravidly poskytování veřejné podpory, platy zaměstnanců; zpracování evaluací, statistických materiálů, studií a zejména analýz

zaměřených na sledování dopadů realizace programu, průběhu jeho realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur a dalších dokumentů, které doplňují základní implementační systém programu; instalace, provoz a propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování, kontrolu a hodnocení operací ROP JV.

Oblast podpory 4.1 v roce 2008

V rámci této prioritní oblasti probíhá realizace projektu „Řízení a implementace ROP JV 2008“, který navazuje na předchozí projekt „Podpora řízení ROP JV“ (realizován řídicím orgánem ROP JV v období I/2007–I/2008). Během sledovaného období byly zahájeny aktivity, které povedou k naplnění cíle projektu, tj. k zajištění aktivit podporujících efektivní řízení, kontrolu, sledování a vyhodnocování realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Hlavní výdaje v měsících červnu, červenci, srpnu a září byly vynaloženy na:

- mzdové výdaje včetně odvodů, odměny expertům
- provozní výdaje (nájemné a služby spojené s nájmem, služby telekomunikací, cestovné, nákup drobného hmotného majetku, služby pošt, pohoštění, platby poplatků aj.)
- výdaje na zajištění odborných posudků projektů
- nákup programového vybavení, notebooků, hardware, software a pomocného technického zařízení, servis programového vybavení
- organizace zasedání pracovních skupin, porad ředitelů atd.

V rámci projektu „Monitoring a evaluace 2008“ byly uskutečněny úpravy monitorovacího systému MONIT7+ a bylo připraveno na zasedání Monitorovacího výboru (MV). Hlavními výdaji byly překlady a korektury materiálů pro MV a dále výdaje na organizaci a pohoštění. Byla také zpracována jedna evaluační studie a v současné době se připravuje zadávání veřejné zakázky na evaluační zprávy⁹.

V rámci oblasti podpory 4.1 byly dosud nasmlouvány finanční prostředky v celkové výši 91 390 000 Kč.

Oblast podpory 4.2 Podpora absorpční kapacity

Hlavním cílem této oblasti podpory je zvyšování absorpční kapacity regionu i ŘO a zajištění úspěšného čerpání prostředků z ROP JV.

V rámci této oblasti podpory jsou podporovány aktivity zaměřené na zvyšování schopnosti příjemců připravovat a následně také úspěšně realizovat projekty spolufinancované z ERDF prostřednictvím ROP JV. Nástrojem bude zejména poskytování asistence potencionálním předkladatelům projektů, a to zejména aktivitami zaměřenými na propagaci programu,

⁹ Blíže k evaluačním aktivitám v kapitole 4.4 Realizace evaluačních činností.

poskytování informací, poradenskou a osvětovou činnost a dále přípravou a realizací vzdělávacích programů. Jde tedy např. o pořádání konferencí, seminářů, dne otevřených dveří a dalších komunikačních aktivit.

Oblast podpory 4.2 v roce 2008

Projekt „Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008“ navazuje na projekt „Publicita a absorpční kapacita“ (realizován řídicím orgánem ROP JV v roce 2007). Během monitorovaného období byly zahájeny aktivity, které povedou k naplnění jak všeobecného, tak i specifických cílů projektu.

Hlavní výdaje v měsících červnu, červenci, srpnu a září byly vynaloženy na:

- Zveřejnění znění výzvy v denících
- Zajištění seminářů pro žadatele
- Zveřejnění personální inzerce
- Výdaje na interní vzdělávání – program Learning by Doing, výuka anglického jazyka na pracovištích Brno a Jihlava, odborné semináře pro zaměstnance,
- Nákup odborné literatury a předplatné novin
- Úprava webových stránek www.jihovychod.cz
- Ostatní provozní výdaje
- Zajištění tiskové konference
- Tisk prezentačních materiálů

Projekt „Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod“ byl schválen Výborem Regionální rady na svém 11. zasedání. Obsahem projektu je zajištění bezplatné expertní podpory příjemcům dotace v rámci ROP Jihovýchod, která povede ke zvýšení kvality implementace projektů a řádnému čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Součástí projektu je kontrola úplnosti a formální správnosti dokumentace pro předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, včetně sdělení veškerých zjištění příjemci a tím zajištění asistence při jejich finalizaci pro předložení na Úřad Regionální rady Jihovýchod. Projekt byl doporučen k financování.

V rámci oblasti podpory 4.2 byly dosud schváleny finanční prostředky v celkové výši 22 445 125 Kč.

4.2 Komunikační plán a jeho realizace

V programovém období 2007–2013 je patrný sílící důraz ze strany orgánů Evropské unie na komunikaci a transparentnost při realizaci evropských politik a zviditelňování jejich praktických dopadů na životy občanů. Tento důraz je vyjádřen legislativními požadavky na implementaci výdajových programů v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti, které odráží důležitost komunikace na regionální a místní úrovni pro překonání „komunikační propasti“ mezi Evropskou unií a jejími občany.

Povinnost propagovat operace a programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je zakotvena v čl. 69 obecného nařízení. Článek 69 stanovuje kromě samotné povinnosti poskytovat informace o spolufinancovaných programech jako hlavní cíl také jejich propagaci, zdůraznění role Společenství a zajištění transparentní pomoci poskytované z fondů.

Komunikační plán ROP Jihovýchod byl předložen Evropské komisi ke schválení dne 31. března 2008. V souladu s článkem 3 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 přezkoumala Evropská komise kompatibilitu komunikačního plánu se článkem 2 (2) nařízení (ES) č. 1828/2006 a dne 14. května 2008 předala Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod své připomínky. Evropská komise následné vypořádání připomínek akceptovala a dne 21. srpna 2008 komunikační plán ROP JV schválila.

Tabulka č. 9: Vypořádání připomínek EK ke Komunikačnímu plánu ROP Jihovýchod 2007–2013 ze dne 14. 5. 2008

Č.	Připomínka	Vypořádání připomínky
1	Cíl transparentnosti není v komunikačním plánu jasně uveden.	Na str. 18 přeformulován globální cíl následovně: „Zajistit, aby podpora poskytovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP JV v programovacím období 2007–2013 byla dostupná a transparentní pro všechny definované cílové skupiny a podpořit tím v regionu Jihovýchod pozitivní vnímání role politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.“
2	Měla by být jasně popsána dělicí čára mezi komunikačními aktivitami podle OP Technická pomoc a tohoto OP.	Vynechán následující odstavec: Požadavky na obsah a zaměření informačních a propagačních aktivit jsou definovány taktéž v NSRR pro programové období 2007–2013. Komunikační aktivity by měly být zaměřeny zejména na informace o: <ul style="list-style-type: none"> • systému, cílech, obsahu a konkrétních výsledcích realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v období 2007–2013, • příležitostech poskytovaných strukturálními fondy prostřednictvím operačních programů v ČR, podmínkách pro žadatele, postupech a pravidlech při poskytování pomoci, výběrových a hodnotících kritériích atp.,



		<ul style="list-style-type: none">• projektech, žadatelích a příspěvcích z veřejných zdrojů,• kontaktních údajích osob na národní, regionální a místní úrovni, které poskytují informace o možnostech a pravidlech poskytování pomoci.
3	<p>V souladu s článkem 7(2) nařízení Komise č. 11828/2006 bude řídicí orgán odpovědný za zorganizování alespoň jedné hlavní informační aktivity ročně. Tato hlavní informační aktivita by měla být v komunikačním plánu podrobněji popsána. Útvary Komise by uvítaly, kdyby byly informovány o kalendáři hlavních komunikačních akcí. Bylo by také vhodné, aby útvary Komise byly dostatečně předem zapojovány do hlavních činností.</p>	<p>Doplněna kap. 4.3, str. 35–36. V rámci této kapitoly jsou přiřazeny k informačním a propagačním opatřením přiřazeny jednotlivé nástroje informovanosti a publicity.</p>
4	<p>Je předložen indikativní rozpočet pro komunikační plán. Ten však představuje přibližně 33% rozpočtu technické pomoci. Všeobecně je navrhováno, aby na opatření informovanosti a publicity bylo vynaloženo maximálně 8–10% rozpočtu technické asistence. Dále nejsou předloženy žádné odhady rozpočtu na nástroje/opatření.</p>	<p>Upraven rozpočet v kapitole 5.1, str. 38. Odhady rozpočtu na jednotlivé nástroje a opatření obsahuje roční komunikační plán.</p>
5	<p>Hodnocení by mělo měřit rozsah, v jakém bylo dosaženo cílů viditelnosti a povědomí o operačním programu, a o roli, kterou hraje Společenství. Doporučuje se, pokračovat v kvantifikaci předpokládaných ukazatelů v komunikačním plánu (základní úrovně a cíle).</p>	<p>Podle našich informací neexistuje nařízení či dokument, na základě kterého by vyčíslení indikátorů výsledků v KoP bylo nutné. KoP Jihovýchod 2007–2013 je strategickým dokumentem, a proto není vhodné tyto indikátory vyčíslovat. Dnes není možné přesně definovat nástroje, které budou používány za několik let. Využití nástrojů závisí na průběžném vyhodnocování předchozích aktivit a zvážení aktuálních potřeb další komunikace. Některé nástroje se mohou stát neefektivními a naopak vznikají nové, které lépe reagují na změny v chování cílových skupin. Průběžné výsledky a sledování pokroku v naplňování jednotlivých cílů a indikátorů stanovených v KoPu, včetně použitých nástrojů komunikace může EK sledovat i v rámci pořádání Monitorovacího výboru, na kterém budou průběžné výsledky prezentovány. V rámci ročních komunikačních plánů budou uvedeny indikátory na úrovni výsledků. Informace o komunikačních aktivitách jsou obsaženy ve výročních zprávách. Ve výroční zprávě v roce 2010 i v závěrečné zprávě budou v samostatné kapitole obsaženy i hodnotící výsledky informačních a propagačních opatření, pojednávající i o průběžných výstupech, výsledcích a dopadech.</p>

Příklady úspěšných realizovaných aktivit v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc:

- **Zahájení komunikační kampaně ROP Jihovýchod** dne 31. března 2008 evropskou komisařkou Danutou Hübner. Pro zahájení kampaně byla vytvořena celoplošná reklama se symboly EU a ROP Jihovýchod umístěná na vozidle (tramvaji) Dopravního podniku města Brna.



- **Konference VIZE 2015.** Výroční konference Regionální rady Jihovýchod zaměřená na budoucí směřování regionu soudržnosti Jihovýchod. Součástí konference jsou souběžně probíhající panelové diskuse na téma doprava, cestovní ruch a rozvoj měst a venkova. Výstupem konference je stanovení memorand pro jednotlivé oblasti a jejich využití do strategie rozvoje regionu.

- **Série seminářů pro příjemce dotace** konané v červnu, srpnu, říjnu a listopadu 2008.



- **Publikace Regionální operačního programu Jihovýchod.** Informační publikace Starosti (nejen) starostů aneb programové desatero.

4

PROSTUDUJ SI

Vyplňování žádosti o dotace z fondů Evropské unie je zdlouhavý proces, vyžadující značnou míru trpělivosti a péle. To však neznamená, že je sestavení dokumentace složité. Kdo si dobře prostuduje pokyny a pak je dodrží, výrazně zvýší své šance na úspěch.

Základní dokument, do detailu popisující postup při vyplňování žádosti, je příručka pro žadatele a tvoří součást souborné dokumentace ke každé jednotlivé výzvě k předložení projektu.

Abyste proces žádání skutečně dobře pochopili, můžete se rovněž zúčastnit několika seminářů pro žadatele, které Regionální rada Jihovýchod pravidelně pořádá. Tam se přímo od pracovníků Regionální rady dozvíte o vyplňování žádosti více.

Rovněž důležitá je znát hodnotící a bodovací kritéria předem vymezující parametry, na jejichž základě se bude váš projekt vyhodnocovat. Navštivte stránky www.jihovýchod.cz, stáhněte si zmíněnou dokumentaci a prostudujte si ji důvě, než začnete projekt zpracovávat.

10

KDO NESTUDUJE PŘÍRUČKU PRO ŽADATELE, NEUSPĚJE



11

4.3 Realizace evaluačních činností

Evaluace ROP JV je prováděna v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci článků 47 až 49 obecného nařízení, v souladu s metodickými pokyny Evropské komise a s metodickými pokyny NOK. Za zajištění evaluace je odpovědný Řídicí orgán. Cílem evaluace je zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z Fondů EU a její konzistence s cíli EU a ČR, zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačního programu, zkoumání specifických strukturálních problémů ČR a udržitelného rozvoje ve vztahu k předmětu operačního programu.

V rámci procesů evaluace probíhají dílčí činnosti, které zabezpečují jak efektivní řízení (nastavení postupů pro evaluace, spolupráce na řízení změn v metodických postupech pro hodnocení a zpracování evaluačního plánu pro hodnocení ROP JV) a realizaci hodnocení/evaluací ROP JV (ex-ante, on-going, ex-post a popřípadě ad-hoc), tak i celkovou podporu a organizaci hodnocení ROP JV (vykazování dat o hodnocení, účast na hodnocení NSRR a spolupráce při zadávání a kontrole projektů technické pomoci).

Evaluační jednotka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod je zajišťována v rámci Oddělení monitoringu a evaluace. Její pracovníci se pravidelně účastní pracovních skupin na národní úrovni (poslední proběhla dne 26. 9. 2008) a připravuje jednání interní pracovní skupiny pro evaluaci na úrovni Regionální rady (poslední proběhla dne 20. 10. 2008).

V současné době se připravuje vyhlášení zadávacího řízení na zpracování čtyř evaluačních zakázek, jejichž komplexním cílem je zkvalitnění implementace ROP JV:

1. Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení evaluačních aktivit
2. Systém hodnocení projektů a hodnotících kritérií ROP JV
3. Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění
4. Analýza a vyhodnocení příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod

Tyto zakázky budou ukončeny v prvním pololetí roku 2009.

Probíhají také interní evaluační práce zaměřené na systém sběru projektových záměrů se strategickým významem pro cestovní ruch.

Na bázi externí spolupráce byla zpracována evaluační studie ke změně bodové hranice pro výběr projektů. Na základě této studie Výbor Regionální rady odsouhlasil snížení spodní hranice pro příjem projektů u některých výzev na 50 bodů¹⁰.

¹⁰ Podrobné informace o této skutečnosti jsou součástí jiného bodu programu 5. zasedání Monitorovacího výboru.

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schválil 7. 10. 2008 Výroční zprávu Regionálního operačního programu Jihovýchod za rok 2007, Evropská komise tuto zprávu přijala.

4.4 Aktivity Monitorovacího výboru

Monitorovací výbor ROP JV (MV) se na základě čl. 65 obecného nařízení ES 1083/2006 přesvědčuje o účinnosti a kvalitě provádění operačního programu, zajišťuje jeho soulad s předpisy ES a legislativou ČR a dohlíží na dosahování cílů programu při efektivním využití veřejných prostředků. Na každém svém zasedání je informován o pokroku v realizaci programu. MV zasedá minimálně dvakrát do roka a jeho složení odpovídá principu partnerství. Ve vertikálním směru se jedná o zastoupení jednotlivých úrovní státní správy a samosprávy a horizontálně odpovídá jeho složení hlavním dotčeným složkám společnosti.

Na svém prvním zasedání (dne 14. 9. 2007 v Jihlavě) vzal Monitorovací výbor ROP JV na vědomí statut MV, přijal etický kodex MV a schválil jednací řád MV. Dále schválil hodnoticí kritéria pro výběr financovaných operací z ROP JV v několika oblastech podpory, vzal na vědomí Evaluační plán ROP JV pro období 2007-2013 a schválil Plán technické pomoci pro období 2007-2013.

Na druhém zasedání (dne 10. 12. 2007 v Brně) Monitorovací výbor schválil hodnoticí kritéria v dalších oblastech podpory ROP JV, vzal na vědomí Evaluační plán ROP JV na rok 2008 a schválil Plán technické pomoci na rok 2008.

Třetí jednání Monitorovacího výboru proběhlo formou korespondenčního zasedání (dne 13. 3. 2008). MV při této příležitosti schválil Komunikační plán ROP JV pro období 2007-2013 a také hodnoticí kritéria pro Integrované plány rozvoje měst.

Na čtvrtém zasedání (dne 4. 6. 2008 v Jihlavě) Monitorovací výbor vzal na vědomí upravené znění statutu MV ROP JV a schválil úpravy svého jednacího řádu. Dále projednal a schválil Výroční zprávu ROP JV za rok 2007 a schválil také hodnoticí zprávu a hodnoticí kritéria projektu na řízení a koordinaci aktivit Integrovaného plánu rozvoje měst.

4.5 Zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP

Ke dni 1. 11. 2008 měl Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 53 zaměstnanců, z toho 40 v Brně a 13 v Jihlavě. Ve sledovaném období nastoupili 2 noví zaměstnanci na Oddělení monitoringu a evaluace, 4 zaměstnanci na Oddělení hodnocení projektů, 1 zaměstnanec Oddělení publicity a technické pomoci, 1 zaměstnanec do Oddělení správy rozpočtu a financování, 2 auditoři PAS, asistent předsedy RR. 1 zaměstnankyně je v současnosti na rodičovské dovolené a 1 zaměstnankyně na mateřské dovolené.



V současné době je plánováno rozšíření počtu zaměstnanců o 5 – v Jihlavě proběhlo výběrové řízení na obsazení 3 pozic a v Brně výběrové řízení na obsazení 2 pozic.

5. Závěry a doporučení

Lze konstatovat, že realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod zdárně pokračuje jak na úrovni programu, tak i na úrovni prioritních os. Ve sledovaném období došlo k poměrně dynamickému vývoji při implementaci programu zejména v důsledku množství vypsaných výzev. Program je kvalitně zajišťován i po administrativní stránce. Nebyly zaznamenány žádné problémy, které by vážně ohrožovaly jeho naplňování.

Za největší riziko v implementaci ROP JV je považován neúplný a nedostatečný monitorovací systém. Jednou z priorit pro další rok tak bude další spolupráce s Národním orgánem pro koordinaci (NOK) na jeho rozvoji. Především by mělo dojít k automatizaci přenosů dat mezi účetním systémem a monitorovacím systémem a dále k rychlému dopracování problematiky žádostí o platbu a monitorovacích zpráv tak, aby bylo minimalizováno množství ručně zadávaných údajů. Připravují se také nové výstupní sestavy z monitorovacího systému, které budou pro vedení ÚRR JV účinnou pomůckou při řízení programu.

Za významné riziko pro implementaci programu v této souvislosti považujeme úmysl NOK nahradit v průběhu roku 2010 současný monitorovací systém systémem novým. Tento by měl být společný pro všechny operační programy, v důsledku toho však již nebude moci odpovídat potřebám každého jednotlivého programu, tedy i ROP JV. V souvislosti s plánovanou změnou mají být navíc od začátku roku 2009 sníženy výdaje na současný monitorovací systém, čímž dojde k výrazným komplikacím tolik potřebného dalšího rozvoje stávajícího systému.

Další prioritou do budoucna zůstává zkvalitňování komunikace s příjemci tak, aby ubylo nedostatečně připravených projektů, a to především formou dalších seminářů pro žadatele a příjemce. Také cílem jednoho z evaluačních projektů, jehož realizace se plánuje na jaře roku 2009, je srozumitelnost dokumentace pro žadatele a příjemce.

ÚRR JV bude i nadále pracovat na posílení vlastní administrativní kapacity. Připravuje se spolupráce s Regionálními rozvojovými agenturami v Jihomoravském kraji i v kraji Vysočina. Půjde především o pomoc s kontrolou monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Toto opatření by mělo přispět k hladkému zvládnutí administrace projektů a tedy i implementace programu jako celku.
